

Liste Unique Qualité

2004

Propriétaire : Responsable projet

Code	Criticité	Origine	Date d'entrée en LU	Auteur	Description	Plan d'actions	Leader	Etat	Solde prév.	Solde Reel
Gestion/Pilotage										
GP - 001	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JMN	Accord négatif du bureau de la Cie sur la poursuite du projet à J5	Au 04/02/04 : Pas de plan d'actions envisageable - Arrêt du projet.	JMN	S	S20/04	S06/04
GP - 002	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JMN	Insuffisance des moyens financiers en phase amont du projet (Ciblerie)	Au 04/02/04 : Révision des dernières hypothèses en cours Au 18/03/04 : GRP Non pertinent de part l'engagement du bureau de la Cie	JMN	S	S08/04	S08/04
GP - 003	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JMN	Financement insuffisant du projet	Au 04/02/04 : Révision des dernières hypothèses en cours Au 18/03/04 : GRP Non pertinent sur la base des tableaux Budget et amortissement - Dans le cas d'un financement insuffisant = Arrêt du projet en J5	JMN	S	S12/04	S12/04
GP - 004	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JMN	Ressources insuffisantes dans les groupes de travail en phase ROC	Au 04/02/04 : Voir définir d'un outil plan de charge - Visite des terrains = Estimation de la charge - A prévoir pour J5 Au 18/03/04 : Estimation de la charge sur la base du retour d'expérience de nanteuil = 10p - GRP non critique	JMN	S	S12/04	S12/04
GP - 005	K3	Rap N°4	08/01/2004	Pdp	Logo de la Cie sur tous les documents projet	Au 21/01/04 : Retrait du Logo de l'équipe en faveur du Logo de la Cie. Voir Cr de la Rap n°05	JMN	S	S04/04	S04/04
GP - 006	K2	Rap N°6	04/02/2004	JJD	Formulaire « Position des cibles » à mettre à jour	Au 18/02/03 : Formulaire à jour	JMN	S	S08/04	S08/04
GP - 007	K2	Rap N°6	04/02/2004	JMN	CDC Arbitres	Au 18/02/04 : Voir CR Rap 7 Attente réponse CDY Au 14/04/04 : Pas exigence hors règlement FFTA - Possibilité de prise en charge de l'arbitrage si CD 78	JMN	S	S15/04	S15/04
GP - 008	K2	Rap N°6	04/02/2004	JJD	Formulaire « Montage des cibles » à mettre à jour	Au 18/02/04 : Formulaire à jour	JMN	S	S08/04	S08/04
GP - 009	K2	Rap n°8	18/03/2004	JJD	Création d'un tableau « Synthèse Réponses Sponsors »	Au 18/03/04 : Tableaux initialisés en S12/04 Au 31/03/04 : Tableaux présentés Action soldée	JMN	S	S14/04	S14/04
GP - 010	K2	Rap n°8	18/03/2004	JJD	Création d'un tableau « Synthèse Evaluation Terrain »	Au 18/03/04 : Tableaux initialisés en S12/04 Au 31/03/04 : Tableaux présentés Action soldée	JMN	S	S14/04	S14/04
Organisation/Réalisation										
OR - 001	GRP	Plan Projet	10/12/2003	PDP	Impossibilité de définir une date cohérente avec les exigences CDY/Cie/FFTA	Au 04/02/04 : Rdv avec président de la Ligue 78 - Quid des attendus du CDY sur le projet - FFTA : Pas de field dans le 78, Voir pour réserver les dates en septembre 2004 Au 18/03/04 : GRP non critique	PDP	S	S12/04	S12/04
GP - 004	GRP	Plan Projet	10/12/2003	PDP	Avis défavorable de la FFTA sur la date de la compétition	Au 04/02/04 : Pas de plan d'actions envisagé - Plus de field dans le 78 depuis 2 ans - Calendrier FFTA : Pas saturé pour cette discipline - A revoir en septembre 2004 Décision de solder l'action	PDP	S	S20/04	S06/04
OR - 003	GRP	Plan Projet	10/12/2003	PDP	Insuffisance des moyens logistiques sur le terrain (Eau, Energie)	Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation Au 18/03/04 : Les terrains pré sélectionnés ne posent pas de Pb - GRP Soldé	PDP	S	S08/04	S08/04
OR - 004	GRP	Plan Projet	10/12/2003	PDP	Insuffisance des moyens de transport de la ciblerie	Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation Au 18/03/04 : Les terrains pré sélectionnés ne posent pas de Pb - GRP Soldé	PDP	S	S08/04	S08/04
OR - 005	GRP	Plan Projet	10/12/2003	PDP	Absence d'assurance sur le jour de la compétition	Au 04/02/04 : Point à faire sur la base des 1er contacts pris avec les assureurs - Revoir ce point avec le CDY Au 18/03/04 : Toujours en attente de la réponse de la Cie d'assurance AU 31/03/04 : Attente de la réponse de la Cie d'assurance AU 28/04/04 : Question posée à la FFTA Au 13/05/04 : Point soldée avec MARSK - Attestation à prévoir en janvier 2005	PDP	S	S20/04	S20/04

OR - 006	GRP	Plan Projet	10/12/2003	PDP	Absence d'un arbitre dans la Cie (point de blocage FFTA)	Au 04/02/04 : revoir ce point avec le CDY Au 18/03/04 : GRP Non critique sur la base des informations du CDY	PDP	S	S12/04	S12/04
OR - 007	K2	Rap N°4	08/01/2004	JMN	Mise en ligne du support de communication (Retard J0)	Au 21/01/04 : Actions en stand-by Bilan lors de la prochaine Rap Au 04/02 : Action en cours Au 18/03/04 : Action soldée	PDP	S	S08/04	S08/04
OR - 008	K1	Rap N°4	08/01/2004	JMN	Lancement du plan média : Mise à disposition des courrier pour les sponsors	Au 21/01/04 : Actions en stand-by Bilan lors de la prochaine Rap Au 04/02/04 : Plan est lancé	PDP	S	S08/04	S06/04
OR - 009	K2	Rap N°4	08/01/2004	JJD	Courrier Cie : Introduction et validation de la démarche de recherche de terrain	Au 21/01/04 : 1er version validée en Rap n°05 Corrections Ok sur la Rap n°06	PDP	S	S04/04	S04/04
OR - 010	K2	Rap N°6	04/02/2004	JMN	Prise de Rdv avec Président Ligue 78	Au 04/02/04 : Prise de Rdv pour S09/04 Au 18/03/04 : Rdv Ok	PDP	S	S08/04	S08/04
OR - 011	K1	Rap N°7	04/02/2004	JJD	Courrier de la Cie pour demande de Rdv avec propriétaire	Au 04/02/04 : Courrier rédigé pour fin de semaine 04 Au 18/03/04 : Action soldée	PDP	S	S08/04	S08/04
OR - 012	K1	Rap N°8	04/02/2004	JJD	Courrier de la Cie pour ONF	Au 04/02/04 : Courrier rédigé pour fin de semaine 04 Au 18/03/04 : Action soldée	PDP	S	S08/04	S08/04

Technique/Sécurité


TS - 001	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JJD/FD	Insuffisance des moyens sanitaires sur le parcours	Au 04/02/04 : Ce point fait partie des fiches d'évaluation des sites - Impossibilité de réaliser le projet si non pris en compte par le projet.	JJD/FD	S	S20/04	S06/04
TS - 002	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JJD/FD	Gestion des contraintes liées à l'utilisation d'un terrain privée	Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation des parcours Au 18/03/04 : En cours d'étude Au 28/04/04 : 1ere version du Cdc présenté - Point lors de la prochaine Rap Au 13/05/04 : Cdc terminé - Formalisation en cours	JJD/FD	S	S20/04	S20/04
TS - 003	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JJD/FD	Gestion des contraintes liées à l'utilisation d'un terrain d'une collectivité	Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation des parcours Au 18/03/04 : Pas de terrain sur une collectivité	JJD/FD	S	S12/04	S12/04
TS - 004	GRP	Plan Projet	10/12/2003	JJD/FD	Absence de moyens métriques	Au 04/02/04 : Action à revoir en J4 Au 18/03/04 : Poste couvert par un sponsors	JJD/FD	S	S12/04	S12/04
TS - 005	K2	Rap N°4	08/01/2004	JJD/FD	Moyens de traitement des détériorations de matériel : Avant, pendant, Après J9	Au 04/02/04 : Action à revoir en J4 AU 28/04/04 : Pris en compte dans les fiches de travail . Action soldée	JJD/FD	S	S20/04	S20/04
TS - 006	K3	Rap N°4	08/01/2004	JMN	Planning de visite de site (Retard du J0)	Au 21/01/04 : Action en stand by Au 04/02/04 : Planning présenté	JJD/FD	S	S08/04	S06/04
TS - 007	K1	Rap N°4	08/01/2004	JJD/FD	Pompiers de Villepreux : Faire une demande à la mairie	Au 21/01/04 : Action en stand by AU 18/03/04 : Pas de visibilité AU 31/03/04 : Rdv mairie de villepreux	PDP	S	S18/04	S18/04

Criticité

	en cours	soldé	
GRP	0	14	
K1	0	4	
K2	0	9	
K3	0	2	Stand by
Total	0	29	0

Données à copier sur la page "Données" (semaine en cours) (TOUS TYPES)

Soldé GRP	-14	
Soldé K1	-4	
Soldé K2	-9	
Soldé K3	-2	
SB	0	
GRP	0	0
K1	0	
K2	0	
K3	0	

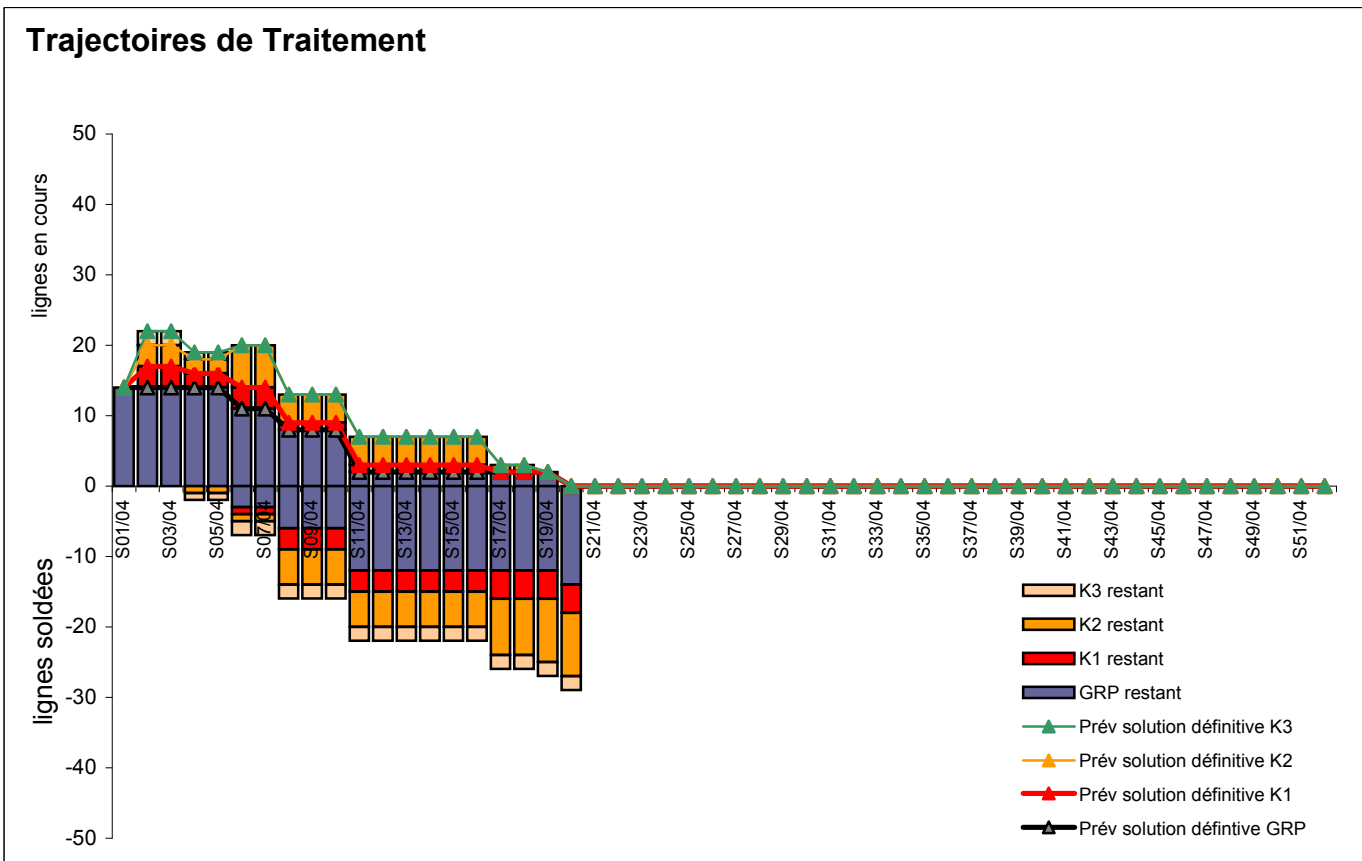

0%	Questions ouvertes	0
100%	Questions soldées	29
0%	Stand by	0
Total Questions		29

